

프로젝트 추진 계획서

1. 개요

1.1 배경 및 필요성

- 최근 각종 중고거래 사이트가 활발히 사용되면서 의류를 포함한 다양한 품목의 중고 거래가 증가하고 있다. 다양한 품목들 중 특히 의류의 경우, 빠르게 변화하는 패션 트렌드와 같은 이유로 인해 중고거래 시장에 지속적으로 유입되고 있다. 하지만, 현재 많이 사용되고 있는 중고거래 플랫폼은 의류뿐만 아니라 다양한 품목들을 모두 다루고 있어 의류 거래에 특화된 검색이나 스타일 추천 등의 기능이 부족하다는 한계를 가지고 있다.
- 본 프로젝트는 의류 거래에 특화된 기능을 제공하는 의류 전문 중고거래 플랫폼을 개발하여 효율적인 거래 환경을 제공하도록 한다. 이를 통해 사용자의 편의성을 향상시키고 현재 상용화 되어있는 중고거래 사이트와의 차별성을 두어 시장독점을 통한 수익 창출이 가능하다고 본다.

1.2 프로젝트 개요

- 본 프로젝트에서는 중고 의류 거래에 특화된 데이터베이스와 커뮤니티 등을 구축함으로써 유저들 간 의류 정보 공유, 중고 의류 거래 등 일반적인 중고거래 플랫폼 보다 의류라는 분야에 더 특화된 시스템을 만드는 것을 목표로 한다.
- 사용자는 상품 등록뿐만 아니라 검색 및 구매 기능을 사용할 때에도 스타일, 사이즈, 브랜드 등의 조건을 기반으로 원하는 상품을 효율적으로 탐색할 수 있도록 설계한다. 또한, 사용자들 간 신뢰도 향상과 유저 간의 정보 공유를 위해 다양한 커뮤니티 게시판도 적용시킨다.
- 보다 편리한 서비스를 위해 모바일 기반 시스템을 만드는 것이 우선적 목표이다.

1.3 프로젝트 산출물

- 시스템 정의서 : 시스템의 초기 제안을 위해 시스템의 목표 및 타당성, 주요 기능에 대해 간략하게 설명한다.
- 프로젝트 계획서 : 프로젝트의 착수를 위한 일정계획, 개발팀의 구성, 프로젝트의 관리방법에 대하여 설명한다.
- 시스템 설계서 : 시스템의 구조 설계 및 데이터베이스, 사용자 인터페이스에 관한 설계사항을 설명하며, 구현을 환경 및 고려사항이 제시된다.
- 프로젝트 시험계획서 : 기능관점 및 성능관점의 시험을 위하여 시험환경, 조건, 입출력, 시험결과 판정방법을 계획한다.
- 프로젝트 결과보고서 : 소프트웨어의 구현이 완료되는 시점에서 작성하며, 시스템의 구조와 동작구조 등을 포함하여 전반적인 구현내용을 일괄적으로 설명한다.

1.4 참고 문헌 및 용어의 정의, 약어 설명

- Reference - 물 중고 악기 거래

2. 추진 일정

2.1 일정표

- ☐ 1~4주차
 - 프로젝트 주제 선정 및 아이디어 구체화
 - 프로젝트의 차별성을 위한 유사 서비스 조사

- ☐ 5~6주차
 - 요구사항 정의
 - 시스템 구조 설계
 - 데이터베이스 설계

- ☐ 7~10주차
 - 회원가입 및 로그인 기능 구현
 - 상품 등록, 수정, 삭제 기능 구현
 - 상품 검색 기능 구현

- ☐ 11~12주차
 - 자유 게시판, 후기 게시판, 스타일 및 공유 게시판 등의 커뮤니티 기능 구현
 - 채팅 기능 구현


- ☐ 13주차
 - 전체 기능을 통합하여 기능 테스트
 - 오류 및 한계 보완

- ☐ 14주차
 - 백엔드 성능 테스트
 - 프론트엔드 개선 및 최적화

- ☐ 15주차
 - 최종 점검 및 보완
 - 발표 자료 및 보고서 작성

3. 프로젝트 팀 구성

3.1 추진 체계

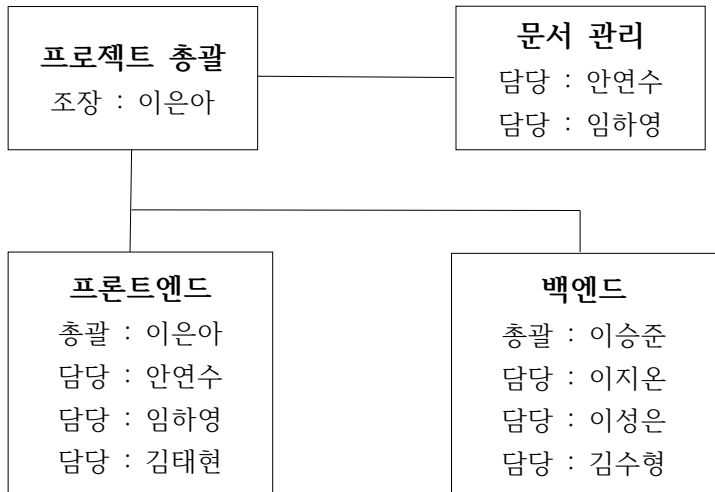

3.2 참여 인력

구분	성명	세부 담당 업무
프론트엔드	이은아	프론트엔드 총괄, 프로젝트 최종 검토
	안연수	프론트엔드 담당, 문서 관리, 중간 및 최종 ppt 담당
	임하영	프론트엔드 담당(디자인 초안), 문서 관리
	김태현	프론트엔드 담당
백엔드	이승준	백엔드 총괄, 중간 보고 발표
	이지온	백엔드 담당, 프로젝트 매니저, 착수 ppt 담당
	이성은	백엔드 담당(데이터베이스 DB)
	김수형	백엔드 담당(깃GIT 관리자)

4. 프로젝트 및 기술 관리

4.1 프로젝트 관리

(1) 회의

☐ 정기회의

- 매주 월요일 2,3교시 캡스톤디자인 수업시간 해당 강의실에서 시행
- 본인이 맡은 분야의 진행 상황 보고 및 통합

☐ 수시회의

- 정기회의에서 수행하지 못한 세부 작업을 각자 진행 후 중간보고를 위해 시행

(2) 문서 검토

☐ 동료 검토

- 문서 담당자들이 작성한 문서를 독방에 업로드 하여 모든 팀원들의 확인 및 검토를 거쳐 수정 및 보완 시행

☐ 문서 결재

- 문서 검토 후 최종본을 작성하여 조장에게 최종 확인을 받음

4.2 위험 관리

(1) 일정 지연 등의 문제 발생

- ☐ 정기 회의에 참여하지 못할 경우 각 분야별 팀원들과 조장에게 보고하여야 하며, 다른 분야와의 프로젝트 수행 정도를 맞추기 위해 추가적인 일정 조정이 필요함
- ☐ 업무 조정이 필요한 경우에는 모든 팀원들과의 협의에 의해 조정되어야 하며, 각 분야별 진행 상황을 완벽히 숙지하고 있어야 함

(2) 기술 구현 문제의 발생

- ☐ 활용하고자 하는 기술의 적용 난이도가 높아 프로젝트 진행에 어려움을 겪는다면 팀원들과 상의하여 다른 방안을 강구해야 함
- ☐ 기존에 계획 되어있던 구현 방법에서 크게 벗어나지 않도록 해야 함

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

- ☐ 개인용 PC 또는 노트북 등

5.2 소프트웨어 환경

- ☐ 운영체제 : Windows 10 이상
- ☐ 개발 언어 : Java/Kotlin
- ☐ 프레임워크 : Spring Boot
- ☐ 개발 도구 : IntelliJ IDEA, Eclipse, android studio

6. 시험 방법

6.1 기능 시험

- ☐ 시스템의 각 기능(회원 관리, 상품관리, 검색, 커뮤니티 채팅 등)이 요구사항에 맞게 수행되는지 검증
- ☐ 개인정보 보안이 잘 이루어지는지 검증
- ☐ 24시간 서비스 제공 및 상시 접속 시 문제점이 없는지 검증

6.2 성능 시험

- ☐ 최소 1,000명 이상, 10,000건 이상의 거래 매물이 올라와 있는 환경에서의 서버 응답 속도 측정
- ☐ 데이터 처리량 증가 시 시스템 안정성 평가
- ☐ 서버 부하 상황에서의 오류 발생 여부 확인 및 무결성 보장 확인
